

REPUBLIQUE DU TCHAD



**Ministère de l'Économie
et de la Planification du Développement
Haut Commissariat National de Déminage**

Présentation: point de situation de l'Action contre les mines au Tchad

Par

M. BRAHIM DJIBRINE BRAHIM


Coordonnateur du HCND

Plan de la Presentation



- **Progrès réalisé depuis 2018**
- **Ce qui reste à faire**
- **Ce qu'il nous faut pour y arriver**
- **Plan de travail prévisionnel (2020-2021)**
- **Budget prévisionnel (2020-2021)**
- **Défi pour la mise en œuvre**
- **Besoin en coopération et assistance**

Zones libérées depuis 2018

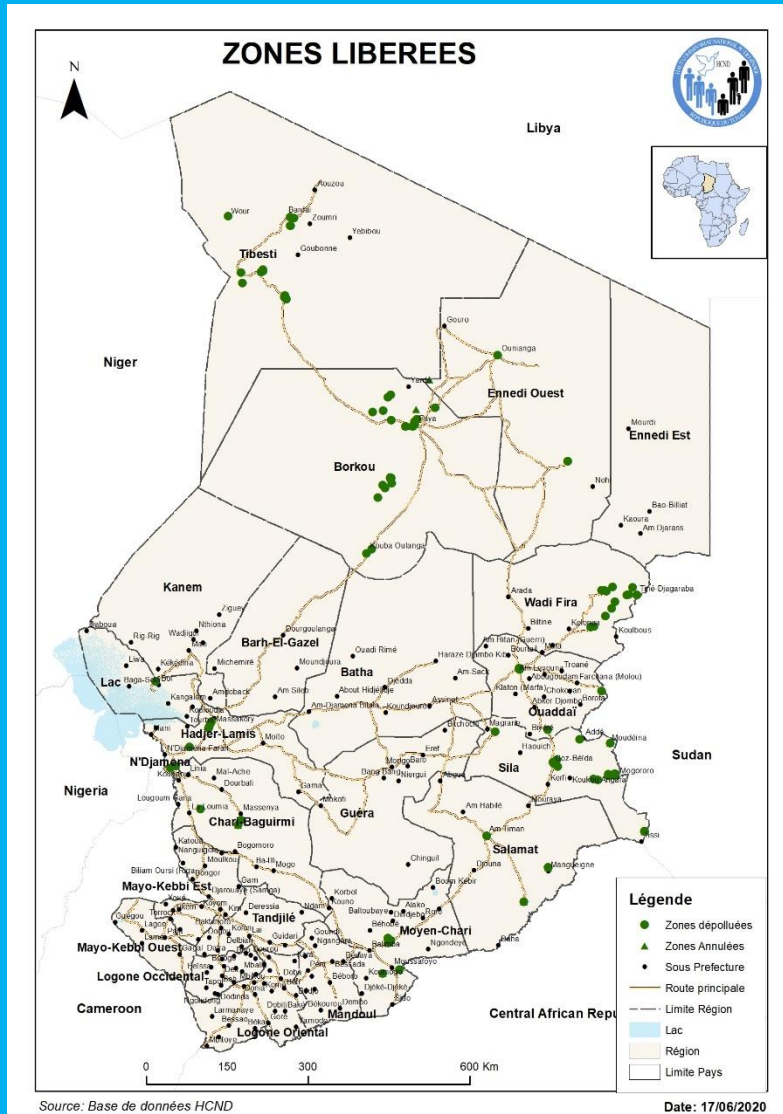

- Surface totale libérées: **4 882 698 m²** dont :
- **721 380 m²** par enquête technique,
- **4 134 152 m²** par enquête non technique et
- **4 872 209 m²** par dépollution
- **167 km** de route dont :
- **164,5 km** par enquête non technique
- **2,5 km** par dépollution




Défis restants au mois de juin 2017 (selon nos connaissances)

Région	Nombres de Zones		Total Général	Surface en m ²		Total Général
	MINE	REG		MINE	REG	
Borkou	26	11	37	18 135 006	802 060	18 937 066
Ennedi	16	5	21	19 576 733	208 658	19 785 391
Lac		5	5		872	872
Salamat		2	2		243	243
Tibesti	88	4	92	43 274 425	31 011	43 305 435
Wadi Fira		2	2		1 166	1 166
Total Général	130	29	159	80 986 164	1 044 009	82 030 173

Nombre de zones dangereuses : **159**

Superficie à déminer: **82 030 173 m²**

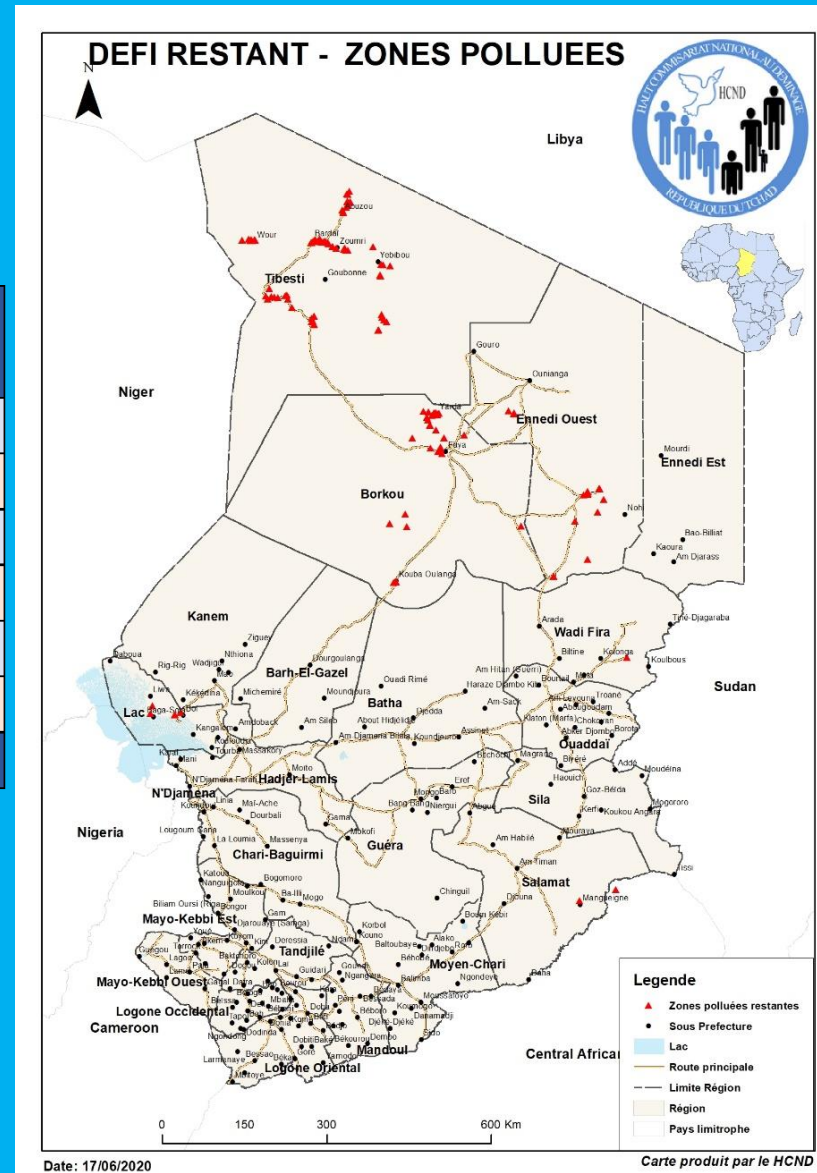

Date: 17/06/2020

Carte produit par le HCND

Plan de travail prévisionnel

(janvier 2020 – Septembre 2021)



Région	Opérateur	Activités à mener	2020												2021									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
N'Djaména	FSD	Appui Institutionnel / renforcements des capacités	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Borkou	HI	Enquête non technique	X	X	X	X	X	X																
		Enquête Technique	X	X	X	X	X	X																
		Dépollution	X	X	X	X	X	X																
Ennedi Ouest	HI et MAG	Enquête non technique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Enquête Technique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Dépollution	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chari-Baguirmi	FSD/HCND	Vérification Données Terrain		X																				
Moyen Chari	FSD/HCND	Vérification Données Terrain		X																				
Salamat	FSD/HCND	Vérification Données Terrain		X	X																			

La faisabilité de ce plan de travail dépendra de la durée de la crise sanitaire.

Plan de travail prévisionnel « COVID »

(janvier 2020 – Septembre 2021)



		Activités à mener	2020												2021								
Région	Opérateur	Activités	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N'Djaména	FSD	Appui Institutionnel / renforcements des capacités	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Borkou	HI	Enquête non technique	X	X	X	X										X	X						
		Enquête Technique	X	X	X	X										X	X						
		Dépollution	X	X	X	X										X	X						
Ennedi Ouest	HI et MAG	Enquête non technique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Enquête Technique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Dépollution	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chari-Baguirmi	FSD/HCND	Vérification Données Terrain		X																			
Moyen Chari	FSD/HCND	Vérification Données Terrain		X																			
Salamat	FSD/HCND	Vérification Données Terrain		X	X																		

[X] mise en œuvre "normale" des activités

[X] suspension des activités pour cause de Ramadan

[X] suspension de la mise en œuvre des activités

[X] reprise hypothétique des activités dans un format différent restant à définir

Défi pour la mise en œuvre



- Insuffisance des ressources financières pour face à l'ampleur du problème, (tant au niveau de la contribution de la communauté internationale que nationale),
- Insuffisance des données collectées et archivées,
 - (mise à jour en cours)
- Besoin supplémentaire de personnel qualifié,
 - EOD 3 et 3+, Inspecteur ACQ, Management, informatique
- Géographie et climat,
 - Saison des pluies
 - Vent de sable
 - Forte chaleur
- COVID 19
 - Suspension des activités jusqu'à nouvel ordre lié à la situation sanitaire

Besoin en coopération et Assistance



- **Assistance** : technique (renforcement des capacités/appui institutionnel)
 - **Base de données**
 - **Planification**
 - **Opération, ACQ & formation**
 - **Management**
 - **Appui à la mise en œuvre des Conventions**
 -
- **Equipements** :
 - **VHL,**
 - **Infra, (HCND central et région)**
 - **Informatique**
- **Ressources financières**

Besoin en coopération et Assistance

Ressources financières



BUDGET PREVISIONNEL GLOBAL (sécurisé en Euros)

Année	2020	2021 (jan - sept 21)	Total
Opérations et Assistance Technique	7 400 000	5 550 000	12 950 000
Acquisitions des matériels et équipements	240 000	13 500	253 500
Salaire et équipements du HCND	2 766 667	2 075 000	4 841 667
Education aux risques et assistance aux victimes	650 000	225 000	875 000
Total	11 056 667	7 863 500	18 920 167

REPARTITION PEVISIONNELLE DES COÛTS PAR ACTIVITES OPERATIONNELLES (sécurisé en Euros)

Année	2020	2021 (jan-sept 21)	Total
Dépollution	3 500 000	2 625 000	6 125 000
Enquête non technique	1 000 000	750 000	1 750 000
Enquête technique	1 500 000	1 125 000	2 625 000
Assistance technique	1 400 000	1 050 000	2 450 000
Total	7 400 000	5 550 000	12 950 000

Total : 18 920 167€ jusqu'au mois de septembre 2021

Merci de votre attention



*Vers un Tchad
sans mine...*

