

جمهورية السودان



عرض غير رسمي لطلب التمديد رقم (3)


1

التقدم المحرز منذ أبريل 2019-31 ديسمبر 2021 (آخر فترة تمديد)

State	Cancelled area (m ²)	Reduced area (m ²)	Cleared area (m ²)	Total area released (m ²)	Number of AP Mines destroyed	Number of AT Mines destroyed	Number of other explosive remnants of war
Kassala	0	0	4,500	4,500	0	0	167
South Kordofan	22,900	0	694,953	717,853	43	19	8,352
Blue Nile	815,398	0	261,536	1,076,934	17	59	2,264
Darfur States	0	0	0	0	0	0	60,161
Total	838,298	0	960,989	1,799,287	60	78	70,944

2

الخطر المتبقي

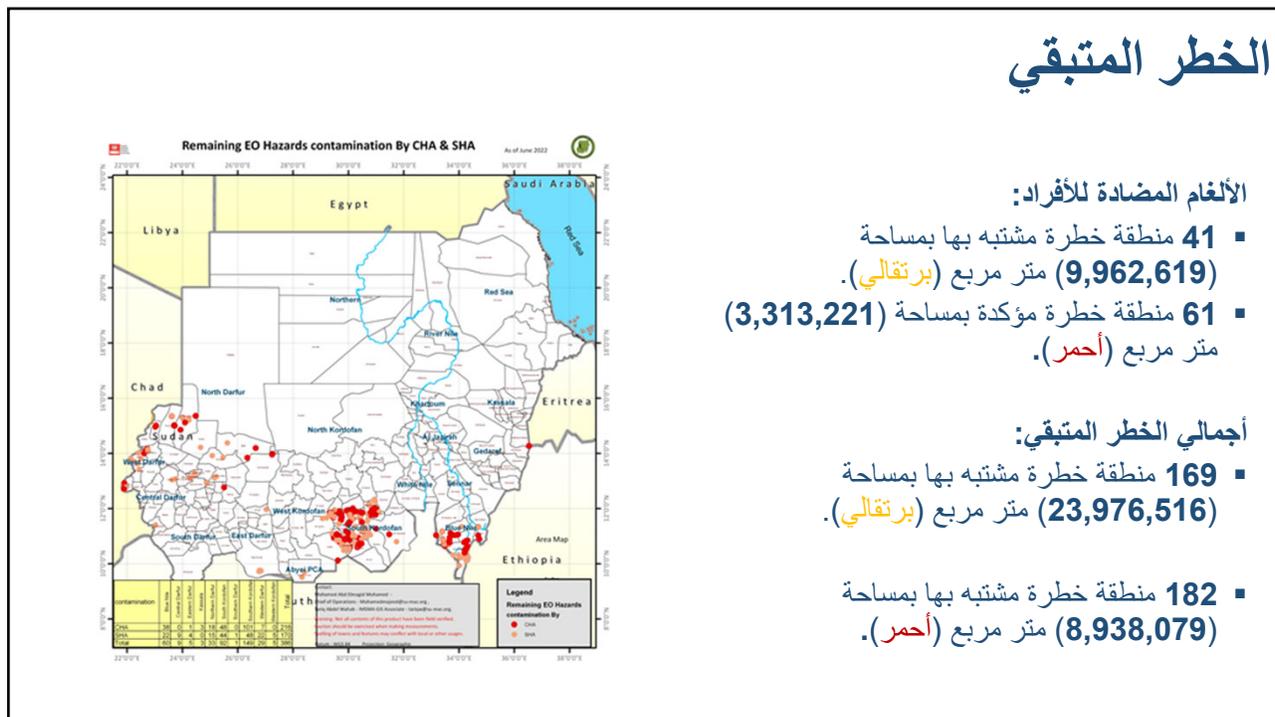

3

الخطر المتبقي

المناطق المؤكدة والمشتبه في احتوائها على ألغام مضادة للأفراد حتى 31 ديسمبر 2021

State	Number of areas known to contain anti-personnel mines	Size of area known to contain anti-personnel mines (square metres)	Number of areas suspected to contain anti-personnel mines	Total size of area suspected to contain anti-personnel mines (square metres)	Total #of areas known or suspected to contain anti-personnel mines	Total size of area known or suspected to contain anti-personnel mines (square metres)
Blue Nile	5	950,274	8	117,962	13	1,068,236
South Kordofan	56	2,362,947	30	9,822,666	86	12,185,613
West Kordofan	0	0	3	21,991	3	21,991
Total	61	3,313,221	41	9,962,619	102	13,275,840

4

الظروف التي أعاقَت الإمتثال

- التمويل غير الكافي لعمليات إزالة الألغام.
- الأوضاع الأمنية و السياسية في البلاد.
- حالة لاحرب ولا سلام التي تخلق بعض الغموض في الوصول إلى مناطق معينة.
- جائحة كورونا.
- مستوى جديد من التلوث.
- تحديات في جمع المعلومات.
- نقص وعدم كفاية معدات إزالة الألغام.
- الألغام / مخلفات الحرب في الأعماق والمحتويات المعدنية للتربة.
- العوامل المناخية والظروف الجوية بما في ذلك 3 إلى 4 أشهر من موسم الأمطار.

5

فترة التمديد والمبررات

- مقدار الوقت المطلوب: 4 سنوات حتى 2027
- الأساس المنطقي:
 - يطلب السودان تمديداً لأربع (4) سنوات ؛ 1 أبريل 2023 - 1 أبريل 2027.
 - يأخذ مقدار الوقت المطلوب في الاعتبار الحاجة إلى إجراء مسح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب و غرب كردفان ومنطقة أبيي مع تحسن الوضع الأمني في تلك الأماكن. في هذا الصدد ، وضع السودان خطة عمل تفصيلية.
 - ومع ذلك ، قد يؤثر تنفيذ المسح على خط الأساس للسودان. وبناءً على ذلك ، سيواصل السودان إبقاء الدول الأطراف على علم سنويًا ، من خلال تقاريره بموجب المادة 7 ومن خلال الأدلاء ببيانات في الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية للاتفاقية ، بشأن ؛
 - أ) التغييرات في الوضع الأمني والتغييرات في الوصول إلى المناطق الملوثة،
 - ب) التقدم في تنفيذ المسح ، بما في ذلك مخرجات المسح وتأثير المسح على التحدي المتبقي للسودان ،
 - ج) المعالم السنوية المحدثة ، بما في ذلك الأولويات.
- بناءً على هذه العوامل الثلاثة ، سيقدّم السودان خطة عمل سنوية ، مع خطة عمل محدثة تم إعدادها للمرحلة الثانية (2025-2027) ، بناءً على هذه العوامل. قد يُطلب من السودان طلب مزيد من الوقت والموارد ، حسب الضرورة. يرجى الرجوع إلى الافتراضات وعوامل الخطر المتعلقة بخطة العمل.

6

الأنشطة التي يتعين القيام بها

- سيجري السودان مسح غير تقني (NTS) على أساس محلي يغطي جميع المناطق المتأثرة والمجتمعات ذات الصلة في ولايات النيل الأزرق وجنوب و غرب كردفان.
- سيتم الإنتهاء من أنشطة المسح في غضون 18 شهراً، لتحديد الحدود الفعلية الدقيقة للتلوث.
- سيتم إستخدام معلومات المسح لتحديث الخطة التشغيلية متعددة السنوات.
- سيبدل السودان جهوداً في تعزيز قدرات المشغلين الوطنيين في الآتي:
 - تطبيق عملية تحرير الأرض بما في ذلك بذل كافة الجهود المعقولة.
 - إدارة المعلومات من خلال (IMSMA Core) وجمع البيانات عبر الإنترنت.
 - تخطيط الأولويات وإدارة العمليات.
 - نظام إدارة الجودة.

7

المعالم المتوقعة

- الجدول الزمني المتوقع والمعالم الرئيسية للإنجازات (بالسنوات)

Year	HZ		SHA		CHA		Total	
	Number	Size	Number	Size	Number	Size	Number	Size
2022-2023	56	5,772,378	59	1,446,316	115	7,218,694		
2023-2024	61	3,958,239	44	3,349,462	105	7,307,701		
2024-2025	32	7,502,014	13	71,159	45	7,573,173		
2025-2026	10	4,918,930	47	3004867	57	7,923,797		
2026-2027	10	1,824,955	19	1,066,275	29	2,891,230		
Total	169	23976516	182	8,938,079	351	32,914,595		

8

المعالم المتوقعة

■ الجدول الزمني المتوقع والمعالم الرئيسية للإنجازات (بالولايات)

State	HZ	No. of CHAs	Size of CHAs	No. of SHAs	Size of SHAs	Total Number	Total Size
Blue Nile		35	2,711,979	21	1,218,732	56	3,930,711
South Kordofan		121	6,142,739	92	20,717,897	213	26,860,636
West Kordofan		0	0	5	21,993	5	21,993
Darfur		26	83361	51	2017894	77	2,101,255
Total		182	8,938,079	169	23,976,516	351	32,914,595

9

تحديات و متطلبات التعاون والمساعدة

تحديات التعاون و المساعدة:

- شح التمويل للبرنامج.
- الوضع الأمني غير المستقر في الولايات المتأثرة بالألغام و مخلفات الحرب.
- الأزمات الاقتصادية.

متطلبات التعاون و المساعدة:

- التمويل لدعم أنشطة الأعمال المتعلقة بالألغام كما هو مخطط.
- المعدات وخاصة الآليات و التقنيات لإزالة الألغام.
- بناء القدرات الوطنية من خلال تفعيل دور المركز السوداني الإقليمي للتدريب على الأعمال المتعلقة بالألغام.
- الإستعانة بالخبراء الدوليين و البرامج التدريبية.

10

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة مدير المركز القومي لمكافحة الألغام بند المادة الخامسة

إجتماعات منتصف الدورات في الفترة من 20 - 22 يونيو 2022م

السيد الرئيس

أصحاب السعادة، الزملاء الكرام، السيدات والسادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1. نلتقى اليوم وبرنامج مكافحة الألغام فى السودان، يسجل تقدماً ملحوظاً نتيجة التنسيق القائم بين المركز القومي لمكافحة الألغام ومكتب الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام و وحدة دعم تنفيذ الإتفاقية و لجنة البند الخامس ونسبة للدعم المتواصل. والتجاوب الذي ظل يبديه الشركاء والمانحون ازاء البرنامج. الأمر الذي أنعكس إيجاباً علي سير تنفيذ مشروعات مكافحة الألغام بالسودان مما ساهم في خفض عدد ضحايا الألغام بالمقارنة مع السنوات السابقة و عليه اعزز إلتزام بلادنا تجاه إتفاقية (أتوا) لحظر إستخدام الألغام المضادة للأفراد .

2. فيما يلي الإجراء رقم (1) من خطة عمل أوصلو، ظلت بلادنا في إطار التزامها باتفاقية (أتوا) تولى أمر برنامج مكافحة الألغام في السودان اهتماماً كبيراً وتقدم حكومتنا دعماً سنوياً تقلص في السنوات الأخيرة لمبلغ (500) الف دولار بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا ولكن حكومتنا ظلت تشجع الجهود الوطنية التي يطلع بها المركز القومي لمكافحة الألغام علي الصعيد الميدانية والتنسيقية وترصد بإهتمام كبير التعاون بين المركز القومي لمكافحة الألغام ومكتب الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام بالسودان و وحدة دعم التنفيذ و لجنة المادة الخامسة والشركاء والمانحين والذي أثمر جهوداً طيبة تمثلت في إنجازات كبيرة علي الارض حيث أعلنت مناطق عديدة في ولايات جنوب كردفان و النيل الأزرق المسجلة المعلومه خالية من الألغام فيما انتهت فرق العمل الميدانية موسما ناجحا في ازالة الالغام والتوعية بمخاطرها، في مناطق ولايتي النيل الازرق وكردفان الخطرة المعلومه المسجلة إذ يتوقف العمل في المنطقتين ل حلول موسم الامطار. هذا بجانب ما تحقق وبذات اللآليات في عمليات التخلص من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة بولايات دارفور كالتزام إضافي خارج نطاق إتفاقية (أتوا) .

أيضاً فيما يلي الإجراء رقم (1) من خطة عمل أوسلو، تعمل الحكومة على فتح ممرات إنسانية عبر التعاون الوثيق مع حركات الكفاح المسلح والأمم المتحدة ومجتمع المانحين من خلال أنشطة مكافحة الألغام المختلفة، ومن هنا تتجلى أهمية تطهير الممرات الإنسانية من الألغام و مخلفات الحرب لضمان وصول هذه المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة في ولايتي جنوب كردفان و النيل الأزرق وستساعد هذه الجهود العديد من المناطق على تحقيق بناء السلام و التنمية.

3. أن بلادنا التي تعيش تحولاً واسعاً في نظم الحكم والسياسات والبرامج وتنعم بمناخ إيجابي وفره الحوار السوداني السوداني المباشر الذي بدأ في الثامن من الشهر الجاري مما يعزز جهود الأطراف المعنية بالسلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور علي المضي قدماً في تعزيز السلام المستدام الذي يشكل أحد مهام الفترة الانتقالية. ومعلوم أن الحكومة قد وقعت في جوبا إتفاق سلام مع الجبهة الثورية في النيل الأزرق والحركات المسلحة في دارفور وبالتالي ستتوفر الإمكانيات لعمليات المسح في المناطق الجديدة لتحديد مدى التلوث والجهد والدعم المطلوب للتطهير .

4. فيما يلي الإجراء رقم (18) من خطة عمل أوسلو، الخطر المتبقي حتى الآن عدد 382 منطقة خطرة بمساحة 38.890.074 متر مربع.

5. فيما يلي الإجراء رقم (19) من خطة عمل أوصلو، سيتم وقف عمليات الإزالة مع بداية فصل الخريف بنهاية الشهر الجاري و البدء في تنفيذ خطة التدريب السنوية في كافة أنشطة مكافحة الألغام.

6. تقدم برنامج السودان لمكافحة الألغام في شهر مارس 2022م بطلب التمديد رقم (3) لإلتزامات المادة الخامسة الخاص بإزالة المناطق الملوثة الخاضعة لسلطة الحكومة، و سيقدم وفد السودان عرض غير رسمي للدول الأطراف لمزيد من التفاصيل.

7. فيما يلي الإجراء رقم (22) من خطة عمل أوصلو، منذ الإجتتماع الإستعراضي بأوصلو تم نشر عدد 13 فريق مسح غير تقني، و على حسب المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام تم إلغاء 838.298 متر مربع، و تم تطهير 960.989 متر مربع، و تحرير 1.799.287 متر مربع و تسليمها للمجتمعات المحلية.

لابد من الإشارة هنا إلى أنه خلال عمليات إزالة الألغام و مخلفات الحرب في ولاية النيل الأزرق لفتح المعابر لتوصيل المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة، تم تسجيل مناطق خطرة تحتوي على ألغام مضادة للأفراد ولذلك سيتم التعامل مع تلك المناطق كمناطق مغلومة في المقام الأول وبعد ذلك يتم التعامل مع المناطق الخطرة الأخرى.

8. أيضاً في الإجراء رقم (22) من خطة عمل أوصلو، أكمل برنامج مكافحة الألغام بالسودان ابتداءً من العام 2002م تسجيل عدد (4.966) منطقة خطرة ظهرت منها عدد(4.584) منطقة خطرة بطرق الإزالة المتعددة بمساحة 137.362.895 متر مربع.

9. فيما يتعلق بالجهود المبذولة لضمان وجود قدرات وطنية مستدامة للتعامل مع الخطر المتبقي في المناطق التي لم تكن معروفة من قبل، وفيما يلي الإجراء رقم (26) من خطة عمل أوصلو، إتّزمت الحكومة و بتمويل حكومي بالإبقاء على مكتب كسلا مفتوح لإستقبال البلاغات من المواطنين و كذلك نشر عدد 2 فريق متعدد الأغراض للتعامل مع إي خطر محتمل، بعد إعلان الولايات الشرقية خالية من الخطر المعلوم و المسجل بقاعدة البيانات. وموخرأ تم نشر تيم متعدد الاغراض وبدعم حكومي لنظافة منطقة كرينك بولاية غرب دارفور .

10. في إطار الإنفتاح الخارجي نؤكد أمامكم جميعاً ترحيبنا بالمنظمات والشركات الدولية الراغبة في العمل بالسودان في مجال مكافحة الألغام للأغراض الإنسانية وتعلمون جميعاً أن عمليات مكافحة الألغام للأغراض الإنسانية ذات كلفة مالية ولوجستية باهظة لذا نطلب منكم جميعاً دعم جهود السودان في هذا المجال حتي نتمكن من توصيل المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة للمناطق

المتأثرة والتي تمثل الألغام ومخلفات الحرب أكبر عائق إمام فتح مساراتها مما يعوق توفير المناخ الملائم لعمليات التنمية وإعادة الإعمار في المناطق المتأثرة ويشمل ذلك تنمية الإنسان والبيئة والبنيات الأساسية المرتبطة بحركة ومعاش الناس .

11. فيما يتعلق بمجال التوعية بمخاطر الألغام و مخلفات الحرب، و الإجراءات رقم (28) و (29) و (30) و (32) من خطة عمل أوصلو، إستطاع برنامج السودان تحقيق نتائج طيبة بنجاح تجربة إدماج منهج التوعية بمخاطر الألغام و مخلفات الحرب في المنهج الدراسي لطلاب المناطق المتأثرة بولايات جنوب كردفان و النيل الأزرق و دارفور والمناطق المتأثرة الأخرى الأمر الذي ساهم في تراجع نسبة الإصابة بالألغام و مخلفات الحرب لدى الأطفال على وجه الخصوص، شملت الخدمات التوعوية بمخاطر الألغام و مخلفات الحرب منذ بداية البرنامج عدد (4.884.278) مواطن بواسطة المنظمات العاملة في تقديم خدمات التوعية بمخاطر الالغام و مخلفات الحرب وشملت التوعية ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وكسلا، و يتم تصنيف المعلومات وفق المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام حسب النوع و الجنس و العمر.

12. بهدف رفع قدرات العاملين الوطنيين في مجال مكافحة الألغام بالسودان وإقليمه، جاءت فكرة إنشاء المركز الإقليمي السوداني للأعمال المتعلقة بالألغام

للأغراض الإنسانية. ويهدف المركز للتدريب على التقنيات الحديثة، والمهارات الجديدة، وأساليب البحث والتطوير المستمر على المستويين المحلي والإقليمي و ذلك تماشياً مع الإجراء رقم (31) من خطة عمل أوسلو.

13. وأخيراً و نسبة للتحديات التي واجهت البرنامج خلال الفترة السابقة وأهمها الموقف الأمني في بعض أجزاء ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وضعف التمويل بالمقارنة مع حجم المشكلة وضعف المعلومات المتعلقة بالألغام والظروف المناخية و أخيراً جائحة كورونا و تأثيرها على البرنامج يحتاج السودان لفترة إضافية للإيفاء ببنود إتفاقية (أتاوا) و للمضي قدماً من أجل تحقيق غاية البرنامج الوصول لسودان خالٍ من الألغام .

شكراً لكم
