




REPUBLIC OF YEMEN
 Prime Ministry
 National Mine Action Committee
 Executive Mine Action Center

Request for extension submitted for consideration by the Twentieth Meeting of the States Parties

6 / 20 / 2022

YEMEN

1

1



- Current deadline: 1 March 2023
- Request for extension for a period of 5 years until March 2028

2

Progress Made

Year	Local People & IDPs/Refugees						Locations
	Adults			Kids			
	Males	Females	Total	Males	Females	Total	
2020	51,407	52,042	103,449	102,202	81,817	184,019	912
2021	31,964	23,083	55,047	61,511	48,812	110,323	4929

6/20/2022

2



- Current deadline: 1 March 2023
- Request for extension for a period of 5 years until March 2028

3

(Number of AP, AT, and EO have found during the clearance operations)

Year	AP	AT	UXO	IED
2020	1,388	17,116	94,558	2,152
2021	1,676	35,866	83,138	2,439

6/20/2022

3



- Current deadline: 1 March 2023
- Request for extension for a period of 5 years until March 2028

4

(Total EORE, Clearance, EOD, and NTS beneficiaries) - 2021

Year	Activity Type	Total Beneficiaries
2021	NTS	853,181
	EORE	165,370
	EOD/EO-Spot Tasks	27,234
Total		1,045,785

6/20/2022

4



- Current deadline: 1 March 2023
- Request for extension for a period of 5 years until March 2028

NTS&HZ achievements - YBLS) - 2021

5

Year	Governorate	No. of NTS Activities	No. of HZ areas	Affected People - HZ
2021	Abyan	32	33	24,3871
	Aden	34	37	465,595
	Al-dhale	16	16	20,413
	Al-hodeida	27	21	90,683
	Laheg	38	43	75,995
	Taiz	27	21	40,404
Total	6	174	171	936,961

6/20/2022

5



Yemen Baseline Survey


6

In Yemen's 2019 request, Yemen reported a remaining challenge of 326 hazardous areas measuring 12,995,161 square meters. This was based on LIS survey and as security improves Yemen will undertake survey to update Yemen's baseline.

Preparations for the Nationwide Non-Technical Survey/Yemen Baseline Survey Preparations were completed in April 2021 with NTS activities beginning in June 2021. NTS operations are ongoing at the moment.

6/20/2022

6

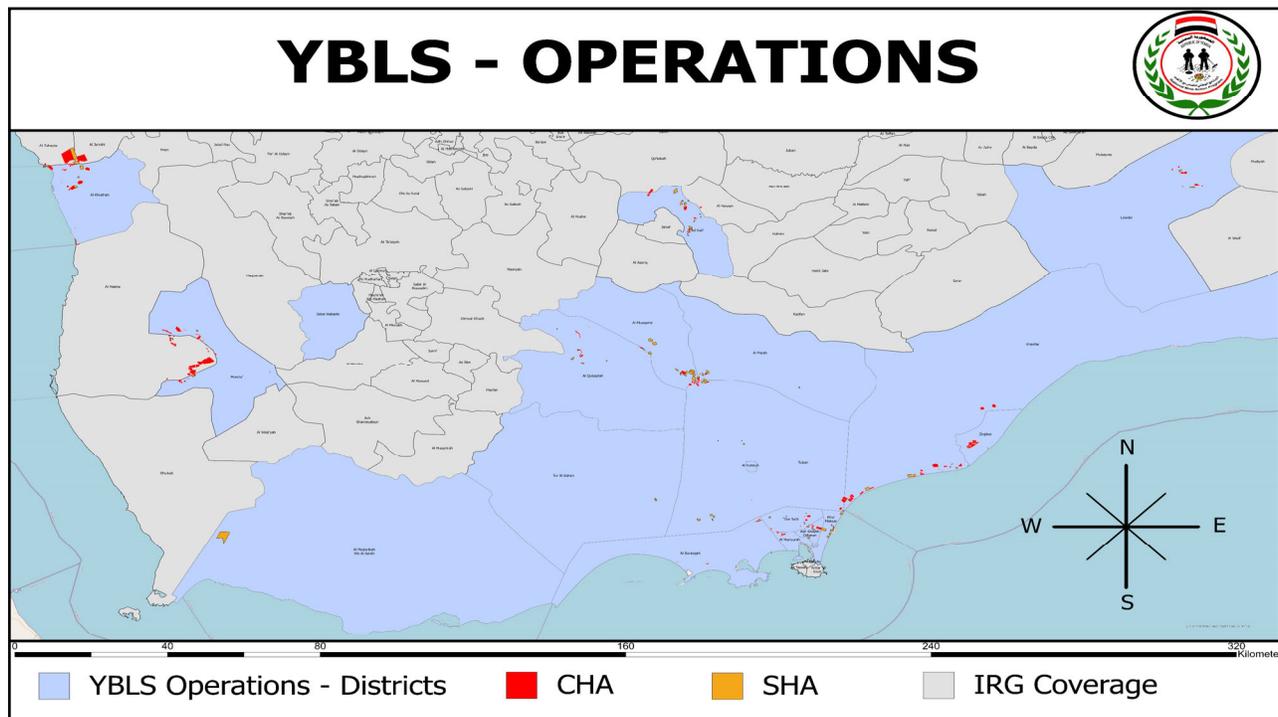

7



SOPs and NMAS Development

8

Developing the Current SOPs and NMAS Chapters:
 Development and updating of National Mine Action Standards (NMAS) and the Standard Operations Procedures (SOP) is still under progress with 95% of NMAS standards having been updated. Progress in this regard includes 32 chapters written and revised in line with IMAS and in fulfillment of commitments under the Oslo Action Plan (OAP). Regarding YEMAC SOPs, updating is in progress; The current plan is to apply the updated NMAS in parallel while following the legal accreditation from the government, which includes approvals and law procedures.

6/20/2022

8



Establishment of a Priority Setting System

9

- National prioritization matrix that relies on open-source info and previous clearance work [District size, number of incidents, number of landmine accidents, estimated total population, and accessibility].
- UN-OCHA prioritization.
- Gathering information about the potentially contaminated locations as a national database to be considered as an external source to relay on with some operational tasking.
- Exceptions based on urgent priorities/needs (i.e., schools, any development projects, local authorities' requests, and so on.
- YBLS outputs.

6/20/2022


9



Information Management System

10

Through the support of GICHD for supporting Yemen and running IMSMA Core About reporting and Information Management matters, Reporting forms for all data were designed and shared with implementing partners, which have been developed through technical working groups between operators under the support of YMACC.

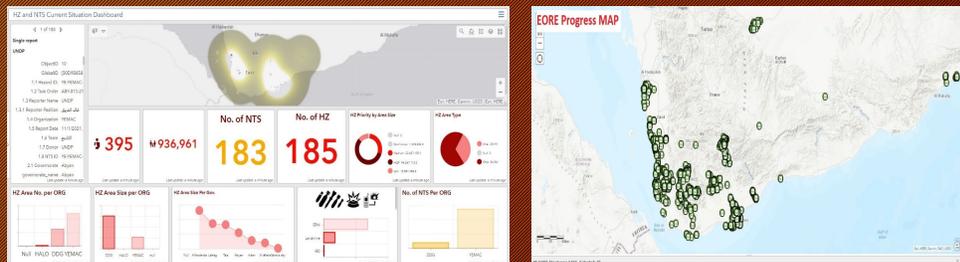

6/20/2022

10



YMACC Establishment & YEMAC Expansion

11

- YMACC is a vital component of YEMAC, responsible for organizing and coordinating activities with INGOs and relevant stakeholders. The establishment of YMACC was done with the approval of the General Secretary of the Prime Ministry in June 2019. Besides the start of its partial operations.
- YEMAC opened a new branch in Taiz, covering and performing mine action activities in Taiz and West Coast but only partially due to its current capabilities because of the current funding situation in 2022.

6/20/2022

11

Current YEMEN Mine Action Programme Structure



6/20/2022

12

12



Remaining challenge

13

- Extension request for 5 years until March 2028.
- During the extension request time, the Yemen mine action programme will continue implementing its emergency response activities to support humanitarian efforts to save lives. This will focus on the prioritized clearance of mined areas based on a prioritization system that includes the local authorities, the humanitarian sector, and local community leaders through the operational decision-making process.

6/20/2022

13



Plan / Timeline

14

Activity	Length of the period to achieve the activity
Mine Action Emergency Response	Ongoing Activity
YBLS	Ongoing Activity
EORE Planning/Implementation	Ongoing Activity
IMAS Compliance	2 Years
Developing the current SOPs	From 6 to 12 Months (Started 2022 March)
Finalizing the NMAS approval and final updates	From 6 to 12 Months (Depending on the governmental procedures)
Ongoing improvement of Information Management system [Reporting]	Ongoing Activity
Bringing new equipment to cover the needs of the Mine Action Programme	Unknown Timeline (Based on the situations plus the funding situations)
Developing National Mine Action Strategy	Every 2/3 Years

6/20/2022

14



Plan / Timeline

15

By the end of the extension period, YEMEN will aim to keep re-orienting YMACC/YEMAC to meet the new challenges with the international community's support. This will include:

- The continuity of YBLS objectives.
- Producing an annual revised work plan to meet its article 5 obligations.
- Enhancing and improving Information Management.
- Supporting the coordination office - YMACC.
- Developing National Mine Action Strategy.

6/20/2022

15



Challenges/Circumstances impeding completion

16

- Ongoing Conflict.
- Capacity.
- Funding.
- Covid-19 Impact.
- Weather.

6/20/2022

16



Needs

17

- Equipment.
- Technical Support.
- Budget needed to target the plan of the extension period (\$48M).
- The continuity of the international community support.

6/20/2022

17



Requirements for Cooperation and assistance

18

Resource mobilization: plans aimed at securing funding:

- YEMEN plans to keep its engagement with APMBC MSP meetings.
- Advocating the programme with any donors' potential discussions.
- Share mine action priorities to relevant stakeholders i.e., UN agencies.
- Foreign affairs via Yemen embassies and permanent missions' discussions with donors.
- Yemen might consider preparing international events to bring more funding.

6/20/2022

18

19

Thank You

POINT OF CONTACT:

Ameen Alaqili
Director of the National Mine Action Programme
ameen.alaqili@ye-yemac.org

Akram Salem Ali.
Office Manager of the director of YEMAC / IM
akram.alaqili@yemac.org

6/20/2022

كلمة البرنامج اليمني للتعامل مع الألغام فيما يخص طلب التمديد المقدم
20 - يونيو - 2022م
الاجتماعات ما بين الدورات
(اتفاقية حضر الألغام المضادة للأفراد)

20- 22 يونيو 2022م

نشكر رئاسة الاجتماع على منح وفد بلادي الكلمة

سيادة الرئيس الحضور الكرام تحية طيبة وبعد

نود بداية ان نهنئكم على رئاستكم لهذا الاجتماع وكذا لجنة المادة الخامسة من اتفاقية
حضر الألغام المضادة للأفراد.

نود ان نلقي موجز عن طلب التمديد المقدم في مارس من هذا العام وهنا نريد ان ننتهز هذه
الفرصة بتقديم مختصر عن فترة التمديد الإضافية لمدة خمس سنوات حتى مارس 2028م
ويهدف الطلب المقدم الى استمرارية اهداف الطلب السابق التي تقدمت به بلادي في المؤتمر
الاستعراضي الرابع للمراجعة في أوصلو 2019م.

أولا سوف اتطرق الى الإنجاز الذي تم اثناء فترة التمديد بداية من عمليات التوعية وحسب
اعمال الاستجابة الطارئة لكل من العام 2020م والعام 2021م كالتالي:

العام	اجمالي الأطفال (ذكور واناث)	اجمالي البالغين (رجال ونساء)	اعداد المواقع المستهدفة
2020م	184,019	103,449	912
2021م	110,323	55,047	4929

واثناء عمليات الاعمال المتعلقة بالألغام كذلك في كل من العام 2020م والعام 2021م تم
استكشاف ما يلي:

العابوات ناسفة	مخلفات حرب	الغام مضادة للدبابات	الغام مضادة للأفراد	العام
2,152	94,558	17,116	1,388	2020م
2,439	83,138	35,886	1,676	2021م

ونريد احاطتكم بأن اثناء فتره التمديد الحالية فلقد كانت هناك استفادة من قبل المجتمعات المتضررة وهذا كبدائية احتساب للمستفيدين منذ تطوير نظام إدارة المعلومات في العام 2021م لمختلف الأنشطة من عمليات توعوية ونزع وتطهير وتخلص من القذائف المنفجرة وعمليات المسوح الغير تقنية بواقع عدد مستفيدين 1,045,785.

سيدي الرئيس – تم الانتهاء من تحضيرات تدشين عمليات المسح الأساسي لليمن في ابريل من العام 2021م وهذا من اجل بناء خط قاعدة اساسي لليمن لتحديد حجم التلوث وتم البدء في عمليات المسح الاساسي على الأرض في يونيو من العام الماضي ومازلت أنشطة المسح الاسي في بلادي مستمرة وفقاً لتسلسل معياري حتى هذه اللحظة كما تشاهدون في الخريطة الموضحة في هذه الشريحة، علماً بأن عمليات المسح الأساسي تتبع وفق نظام استهداف على مستوى المديرية وكذلك كما ترون في هذه الشريحة الإنجازات المحرزة في هذا الشأن.

ومن ضمن الالتزامات في فترة التمديد الحالية وتزامناً مع الالتزامات بخطة عمل أوصلو فلقد تم الانتهاء من عملية تطوير المعايير الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام وتتم حالياً عملية مراجعتها قانونياً.

تم انشاء اليه وأنظمة لتحديد الأولويات كالتالي:

1. انشاء نظام تحديد أولويات ومصفوفة لعمليات المسح الأساسي في اليمن تركزت على احجام المديرية المستهدفة واعداد الحوادث والوقائع ذات الصلة مقارنة بالأعداد التقديرية للمجتمعات السكانية وإمكانية الوصول.
2. الاخذ بعين الاعتبار بأولويات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة.
3. جمع المعلومات من قبل السلطات المحلية والجهات ذات الصلة وتصميمها في قاعدة بيانات كمصدر خارجي للمهام العملياتية.
4. هناك بعض الاستثناءات والتي قد تكون على شكل استجابات عاجلة لطلبات السلطات المحلية كالمدارس والمشاريع التنموية وغيرها.

5. مخرجات عمليات المسح الأساسي لليمن وفق نظام تحديد أولويات للمناطق المشتبه والمؤكد خطورتها.

الجهود المبذولة لضمان إخلاء المدنيين من المناطق الملوثة.

يتم العمل بأنشطة التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة على مراحل مختلفة على النحو التالي:

- التوعية المصاحبة: التي يتم تنفيذها في نفس الوقت مع أنشطة التطهير.
 - حملات التوعية: وهي عملية توعية طويلة تستهدف مواقع محددة بناءً على احتياجات تحديد الأولويات المختلفة، حيث يسلط هذا الطلب ومشاريع الاتفاقيات الفرعية الضوء لكل شريك منفذ على تحديد الجداول الزمنية.
 - التوعية الطارئة: يتم تضمين هذا النوع من أنشطة التوعية بالمخاطر ضمن عمليات الاستجابة الطارئة المستمرة.
 - تدريب المتدربين: من خلال إشراك السلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وبعض الهيئات الوزارية ذات الصلة.
- يتم بالفعل النظر في جوانب الجنس / الجندرة والتنوع من خلال التأكد من مشاركة الإناث، والجوانب الثقافية المختلفة، وتطبيق المبادئ الإنسانية، والتي تضمن إجراء جلسات توعوية مناسبة.

بمساعدة تقنية من قبل مركز جينيف الدولي لأزالة الألغام لأغراض إنسانية GICHD تم تفعيل نظام الامزما كور وتطوير اليه التقارير لكافة الأنشطة في مجال الاعمال المتعلقة بالألغام كما وتم مشاركتها مع مختلف أصحاب المصلحة ذات الصلة وتم استمرارية التطوير لهذا النظام عبر مجموعات عمل تقنية مع مختلف الشركاء وبدعم من مكتب التنسيق للأعمال المتعلقة بالألغام.

وحسب خطة عمل الفترة الحالية من التمديد وبدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNPD فلقد تم انشاء مكتب تنسيق للأعمال المتعلقة بالألغام وهذا وفق موافقة حكومية تمت عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء اضافةً الى فتح فرع للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في تعز وهذا لتنفيذ الأنشطة بشكل جزئي في كل من محافظة تعز والساحل الغربي

نظراً لحجم الإمكانيات المتاحة بسبب مشكلة التمويل التي يعاني منها البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام لهذا العام.

ان البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام يماك يعمل مع مجموعة من الشركاء كالتالي:

1. وزارة الدفاع – دائرة الهندسة العسكرية.
2. البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.
3. منظمة اليونيسيف.
4. مشروع مسام.
5. المجموعة الدنماركية لأزاله الألغام.
6. منظمة هالوترست.
7. منظمة مساعدات الشعب النرويجي.
8. مركز جينيف الدولي لأزاله الألغام لأغراض إنسانية.
9. اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
10. جمعية الهلال الأحمر اليمني.
11. مؤسسة شباب أبين.
12. منظمة هاندي كاب.

يطلب اليمن فترة تمديد إضافية لمدة خمس سنوات حت مارس 2028م وهذا لاستمرارية اهداف فترة التمديد الحالية وسوف تكون خطة العمل كالتالي:

1. استمرارية اعمال الاستجابة الطارئة.
2. استمرارية عمليات المسح الأساسي لليمن.
3. استمرارية الاعمال التوعوية بمخاطر الذخائر المنفجرة.
4. عملية الامتثال بالمعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام.
5. استكمال إجراءات اعتماد كل من المعايير الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام والإجراءات التشغيلية الثابتة.
6. عمليات التحسين المستمرة لنظام إدارة المعلومات للأعمال المتعلقة بالألغام.
7. محاولة جلب معدات إضافية لتغطية الاحتياجات للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام.
8. تطوير استراتيجية وطنية للأعمال المتعلقة بالألغام كل سنتين الى ثلاث سنوات.

سيدي الرئيس هناك تحديات سببت معوقات لليمن في الانتهاء من التزاماتها كالتالي:

أولاً: استمرارية النزاع مما تسبب في زيادة مستوى التلوث ومنع الوصول لبعض المناطق وكذلك مثل ظهور ذخائر متفجرة مبتكره والاختلاف في أولويات الاستجابة للنزاع في المناطق المحررة وأسباب انعدام الامن في بعض المناطق.

ثانياً: بناء القدرات: تحتاج بلادي الى المزيد من بناء القدرات لمعالجة التلوث الجديد وكذا معدات إضافية كما أشار اليه الطلب المقدم.

ثالثاً: التمويل بداية من انخفاض مساهمة حكومة بلادي جراء التحديات الاقتصادية وعدم معرفة حجم الدعم المتوقع من قبل المانحين مما يسبب صعوبة في عمليات التخطيط وحجم وجود أي منح مباشرة قدمت للجانب الوطني إضافة الى الانخفاض الأخير في الدعم الدولي المقدم لليمن مما سوف يؤثر على سير عمل عدد 66 فريق ميداني وادارات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ومكت التنسيق وايماك.

رابعاً: الاثار المترتبة من ازمة كوفيد 19 على سبيل المثال تقليص الأنشطة التوعوية لكل من العام 2020م والعام 2021م.

خامساً: الظروف الجوية التي تسببها الفيضانات للمياه بتحريك بعض الذخائر المنفجرة الى مناطق أخرى.

يحتاج البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام الى جلب مزيد من المعدات واستمراره للدعم التقني ودعم المجتمع الدولي وتم تقدير الميزانية لفترة طلب التمديد المقدم بواقع 48 مليون دولار امريكي كما أشار اليه الطلب المقدم.

هناك متطلبات للمساعدة والتعاون في هذا السياق سوف تكون خطة اليمن بشكل اولي لحشد الموارد لفترة التمديد القادمة من خلال استمرارية الإيفاء بالالتزامات الدولية لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد وكذا الانخراط في أي اجتماعات محتملة مع الجهات المانحة ومشاركة الأولويات مع مختلف أصحاب المصلحة وكذا من خلال وزارة الخارجية وبعثات وسفرات الجمهورية اليمنية للتواصل مع الجهات المانحة وعلماً بأن اليمن يأخذ بعين الاعتبار إمكانية ترتيب فعاليات دولية في هذا الشأن لجلب المزيد من الدعم الدولي.

نؤكد التزام اليمن بتقديم تحديثات حول الإنجازات المحققة ضمن تقارير الشفافية حسب المادة السابعة من الاتفاقية.

- سيدي الرئيس لقد استلمنا ملاحظات لجنة المادة الخامسة حول طلب التمديد المقدم وعن المعلومات الإضافية ونؤكد لكم بأنه سوف يتم البت في هذا الشأن.

- سيدي الرئيس الحضور الكرام: نتمنى بان يتم مراعاة الظروف التي تعاني منها بلادي ونأمل ونتطلع ايضاً الى الدعم السخي من الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات الإنسانية للوقوف مع اليمن ومساعدتها للإيفاء بالتزاماتها بموجب المادة الخامسة لاتفاقية حضر الأलगام المضادة للأفراد.

- واخيراً أسمح لي سيدي الرئيس ان اتقدم بالشكر الجزيل اليكم ومن خلالكم الى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة اليابان وهولندا وألمانيا والنرويج وبلجيكا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الدول والمنظمات الغير حكومية التي دعمت وتعمل على دعم الحكومة اليمنية للتغلب على تلك التحديات والذي سيسهل على حكومة اليمن ايفاء التزاماتها بموجب المادة الخامسة.

تقبلوا جزيل الشكر

وفد الحكومة اليمنية

جينيف 20-22 يونيو 2022م
